

GRUNDSANIERUNG UND UMSTRUKTURIERUNG DER FAKULTÄT FÜR CHEMIE

Gebäude E, neues Hörsaalgebäude

Der neue Hörsaal ist im Rohbau fertiggestellt. Die alte Wand zum ehemaligen Aufzugschacht wurde entfernt, sodass jetzt der Westteil bis auf die Teilbereiche der Stahlbetondecke und die Stahlbauarbeiten der Technikzentrale im Rohbau abgeschlossen ist.

Wie in der letzten Ausgabe angedeutet musste die Decke über dem ehemaligen Gasflaschenlager abgebrochen werden. Die neue Decke ist bereits betoniert. Die darüber liegende Decke wird in der kommenden Woche betoniert.



Bild 1 – Ostteil Bereich ehemaliges Gasflaschenlager

Die Vorbereitungen für die Änderung der Deckenhöhe auf der Südseite haben begonnen. Durch diese Maßnahme soll aufgrund der vorher ungünstigen Deckenhöhen von ca. 2,0 und 6,5 m, vollwertige Hauptnutzfläche mit gleicher Deckenhöhe von ca. 4,2 m geschaffen werden. Der damalige Zugang vom Zwischenpodest der Treppe entfällt. Hierzu muss zunächst eine tragende Mittelwand durch eine neue Wand ersetzt werden, anschließend wird die neue Decke erstellt. Sobald dieser Bereich standsicher hergestellt ist, kann mit dem Dach begonnen werden.

Weitere Arbeiten laufen im Inneren des Gebäudes: Ergänzungen von Mauerwerk, Betonieren von Treppen, Pfeilern und Wandstücken, um das Gebäude für die weiteren Gewerke vorzubereiten. Der Bereich für die zentrale Toilettenanlage ist im Rohbau abgeschlossen, Grundleitungen sind verlegt.

Provisorien

Im Provisorium 1.3 – Kleingruppe AC Gebäude D Sockelgeschoss - sind die Labormöbel aus dem Praktikum der AC umgebaut worden. Die Fertiginstallation und Inbetriebnahme erfolgen wie geplant ab Anfang Mai.

In den Provisorien 2.3 – Gebäude D Erdgeschoss und 2.6 – Gebäude J Sockelgeschoss - sind die Umbauarbeiten abgeschlossen und die Labormöbel aufgebaut. Abnahme und Inbetriebnahme laufen parallel zum Provisorium 1.3, sodass auch diese Räume Mitte Mai wie geplant bezogen werden können.

Die Bibliothek im 4. Obergeschoss des IAC ist geräumt. Hier wird die Elektroinstallation zurzeit zurückgebaut, die Abbrucharbeiten können am 02.05.2016 beginnen.

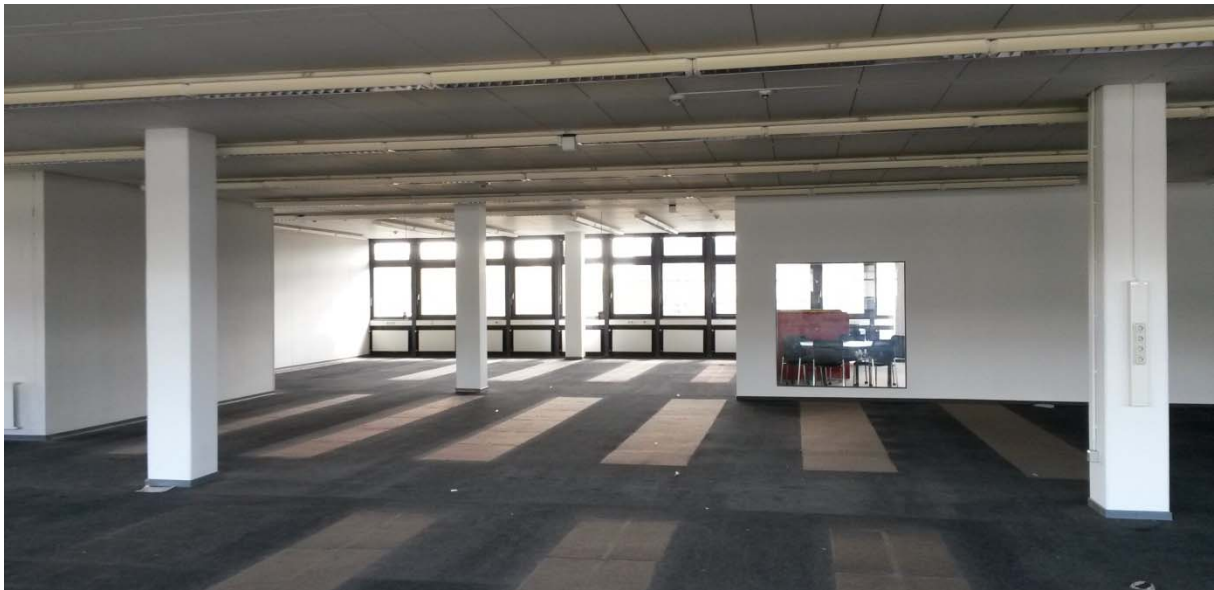


Bild - Ehemalige Bibliothek im 4. OG des IAC



Bild - Ehemalige Bibliothek im 4. OG des IAC
